HIDROGEO
ENGENHARIA & POÇOS
SONDAGENS · PERFURAÇÃO · GEOTECNIA

HIDROGEO ENGENHARIA E POÇOS ARTESIANOS LTDA.
CNPJ: 18.492.310/0001-54
End. Av. Los Angeles, 269 – Bairro Jardim Califórnia
Sorriso-MT / CEP 78894-183 / Fone: (65) 3624-1389 Celular: (65) 99972-3112
E-mail: diretoria.geo@geoeste.com.br

1. IDENTIFICAÇÃO DO SERVIÇO

Nº DA OS	OS-2026-0842 / CTR-119	TIPO DE SERVIÇO	—
DATA EXECUÇÃO	04/11/2026	STATUS FINAL	Concluído
CONTRATO / REF	—		

2. CLIENTE E LOCAL

CLIENTE MANDANTE
Agroindustrial Vale do Rio Pardo S/A

CNPJ / CPF
—

ENDEREÇO TÉCNICO
Fazenda Santa Helena — Gleba 04, Ribeirão Preto / SP

CIDADE / UF
—

CONTATO LOCAL
—

TELEFONE
—

3. INFORMAÇÕES DO POÇO

POÇO (TAG)	PT01	PROFUNDIDADE	160,00 m
DIÂMETRO (Ø)	6" (150 mm) Aço Carbono Schedule	CRIVO	N/I
NÍVEL ESTÁTICO (NE)	22,40 m	NÍVEL DINÂMICO (ND)	64,10m
VAZÃO MENSURADA	10,29m³/h	TUBO EDUTOR	N/I
ELETRODO SUPERIOR	N/I	ELETRODO INFERIOR	N/I
COORDENADAS UTM	N/I		

CONJUNTO MOTO-BOMBA	Ebara 4BHS-15 7,5 CV Trifásica 380V (Crivo 114m) - (USADO)
PAINEL ELÉTRICO	N/I - (USADO)

ANEXO TÉCNICO VINCULADO: RELATÓRIO ESPECIALIZADO DE TESTE DE BOMBEAMENTO (3 PÁGINAS) — CONSTANTE AO FINAL DESTE RELATÓRIO

5. SERVIÇOS TÉCNICOS EXECUTADOS

MEMORIAL DESCRITIVO DAS ATIVIDADES

1. OBJETIVO DO SERVIÇO

Conclusão da perfuração do Poço Tubular Profundo PT-01, execução de teste de bombeamento escalonado e contínuo (24 horas) conforme ABNT NBR 12212 / NBR 12244, seguido de instalação definitiva do conjunto moto-bomba submerso e comissionamento elétrico.

2. ATIVIDADES TÉCNICAS EXECUTADAS EM CAMPO

- Perfuração finalizada aos 160,00 m de profundidade, atravessando pacote sedimentar e basalto fraturado do Sistema Aquífero Guarani/Serra Geral;
- Aplicação de cimentação sanitária no espaço anelar superior (0 a 24,00 m) e execução de laje de proteção sanitária em concreto armado (1,50 x 1,50 x 0,15 m);
- Desenvolvimento completo por injeção de ar comprimido (air-lift) durante 6 horas até total ausência de partículas em suspensão;
- Teste de vazão contínuo de 24 horas: Nível Estático inicial (NE) medido em 22,40 m e Nível Dinâmico estabilizado (ND) em

86,50 m para vazão de explotação de 18,40 m³/h (Capacidade Específica: 0,287 m³/h/m);
- Descida da coluna edutora em tubos galvanizados a fogo de 2.1/2" com bomba submersa posicionada a 114,00 m de profundidade, acompanhada de cabo PP 3x6,0 mm² e sensores de nível inferior/superior.

3. PARECER E RECOMENDAÇÕES OPERACIONAIS
O poço apresenta excelente recuperação residual (96% do nível original atingido em 35 minutos após desligamento). Sistema entregue em regime automático e validado pelo fiscal da contratante.

7. CHECKLIST DE CONFORMIDADE E SEGURANÇA

[ ] Uso completo dos Equipamentos de Proteção Individual (EPIs)	PENDENTE
[ ] Sinalização e isolamento do perímetro de trabalho	PENDENTE
[ ] Verificação de aterramento e isolamento do painel elétrico	PENDENTE
[ ] Vedação hermética e proteção sanitária da boca do poço	PENDENTE
[ ] Limpeza, recolhimento e destinação adequada de resíduos e insumos	PENDENTE

9. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE EVIDÊNCIAS



Figura 01 — Sonda perfuratriz rotopneumática posicionada e patolada no ponto locado (PT-01), com início de perfuração em diâmetro de 10" para

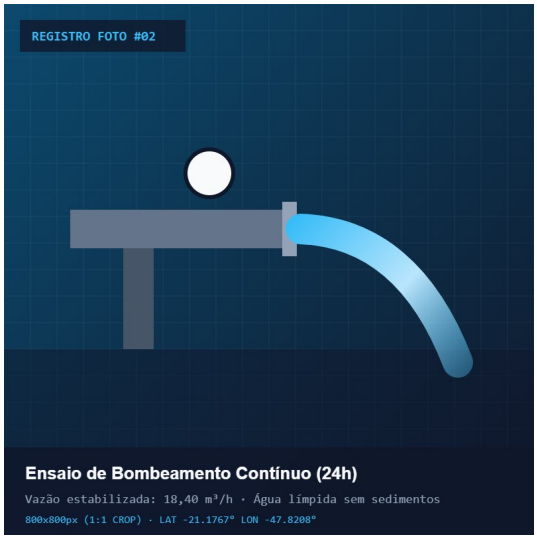


Figura 02 — Descarga contínua durante teste de vazão de 24 horas com hidrômetro totalizador e tubo Pitot. Estabilização hidrodinâmica em 18,40 m³/h com água

HIDROGEO ENGENHARIA E POÇOS ARTESIANOS LTDA.
CNPJ: 18.492.310/0001-54
End. Av. Los Angeles, 269 – Bairro Jardim Califórnia
Sorriso-MT / CEP 78894-183 / Fone: (65) 3624-1389 Celular: (65) 99972-3112
E-mail: diretoria.geo@geoeste.com.br



Figura 03 — Conferência dimensional e teste de isolação com megôhmetro no conjunto moto-bomba submerso em aço inox antes da descida aos 114,00



Figura 04 — Comissionamento do quadro elétrico de comando com aferição de tensão (380V) e corrente nominal balanceada (11,4 A) nas três fases.


HIDROGEO
ENGENHARIA & POÇOS
SONDAGENS · PERFURAÇÃO · GEOTECNIA

HIDROGEO ENGENHARIA E POÇOS ARTESIANOS LTDA.
CNPJ: 18.492.310/0001-54
End. Av. Los Angeles, 269 – Bairro Jardim Califórnia
Sorriso-MT / CEP 78894-183 / Fone: (65) 3624-1389 Celular: (65) 99972-3112
E-mail: diretoria.geo@geoeste.com.br

ANEXO I.1 — PLANILHA E GRÁFICO SEMI-LOG DE TESTE DE BOMBEAMENTO (ETAPA 48H)

Proprietário: Agroindustrial Vale do Rio Pardo S/A | O.S.: OS-2026-0842 / CTR-119 | Poço: PT01 | Crivo: 84,00m | N.E.: 22,40 m
Responsável: JOSE ROBERTO RIBEIRO (160.846.674-49) | Período: 13/03/2026 (11:30:00 às 18:10:00)

Hora	t (min)	N.D. (m)	Q (m³/h)	s med (m)	Obs.
11:31:00	0001	26,90	14,400	**4,50**	
11:32:00	0002	29,40	14,400	**7,00**	
11:33:00	0003	30,20	14,400	**7,80**	
11:34:00	0004	32,40	14,400	**10,00**	
11:35:00	0005	35,60	14,400	**13,20**	
11:36:00	0006	37,90	14,400	**15,50**	
11:37:00	0007	39,80	14,400	**17,40**	
11:38:00	0008	42,40	14,400	**20,00**	
11:39:00	0009	43,90	14,400	**21,50**	
11:40:00	0010	44,90	14,400	**22,50**	
11:42:00	0012	46,50	12,000	**24,10**	
11:44:00	0014	46,90	12,000	**24,50**	
11:46:00	0016	48,40	12,000	**26,00**	
11:48:00	0018	49,40	12,000	**27,00**	
11:50:00	0020	50,40	12,000	**28,00**	
11:55:00	0025	52,40	12,000	**30,00**	
12:00:00	0030	53,10	12,000	**30,70**	
12:05:00	0035	54,60	12,000	**32,20**	
12:10:00	0040	55,80	12,000	**33,40**	
12:15:00	0045	57,00	12,000	**34,60**	
12:20:00	0050	57,90	12,000	**35,50**	
12:30:00	0060	59,40	12,000	**37,00**	
12:40:00	0070	60,35	12,000	**37,95**	
12:50:00	0080	61,40	12,000	**39,00**	
13:00:00	0090	62,10	12,000	**39,70**	
13:10:00	0100	62,90	12,000	**40,50**	
13:40:00	0130	63,70	10,286	**41,30**	
14:10:00	0160	64,10	10,286	**41,70**	
14:40:00	0190	64,10	10,286	**41,70**	
15:10:00	0220	64,10	10,286	**41,70**	
15:40:00	0250	64,10	10,286	**41,70**	
16:10:00	0280	64,10	10,286	**41,70**	
16:40:00	0310	64,10	10,286	**41,70**	
17:10:00	0340	64,10	10,286	**41,70**	
17:40:00	0370	64,10	10,286	**41,70**	
18:10:00	0400	64,10	10,286	**41,70**	

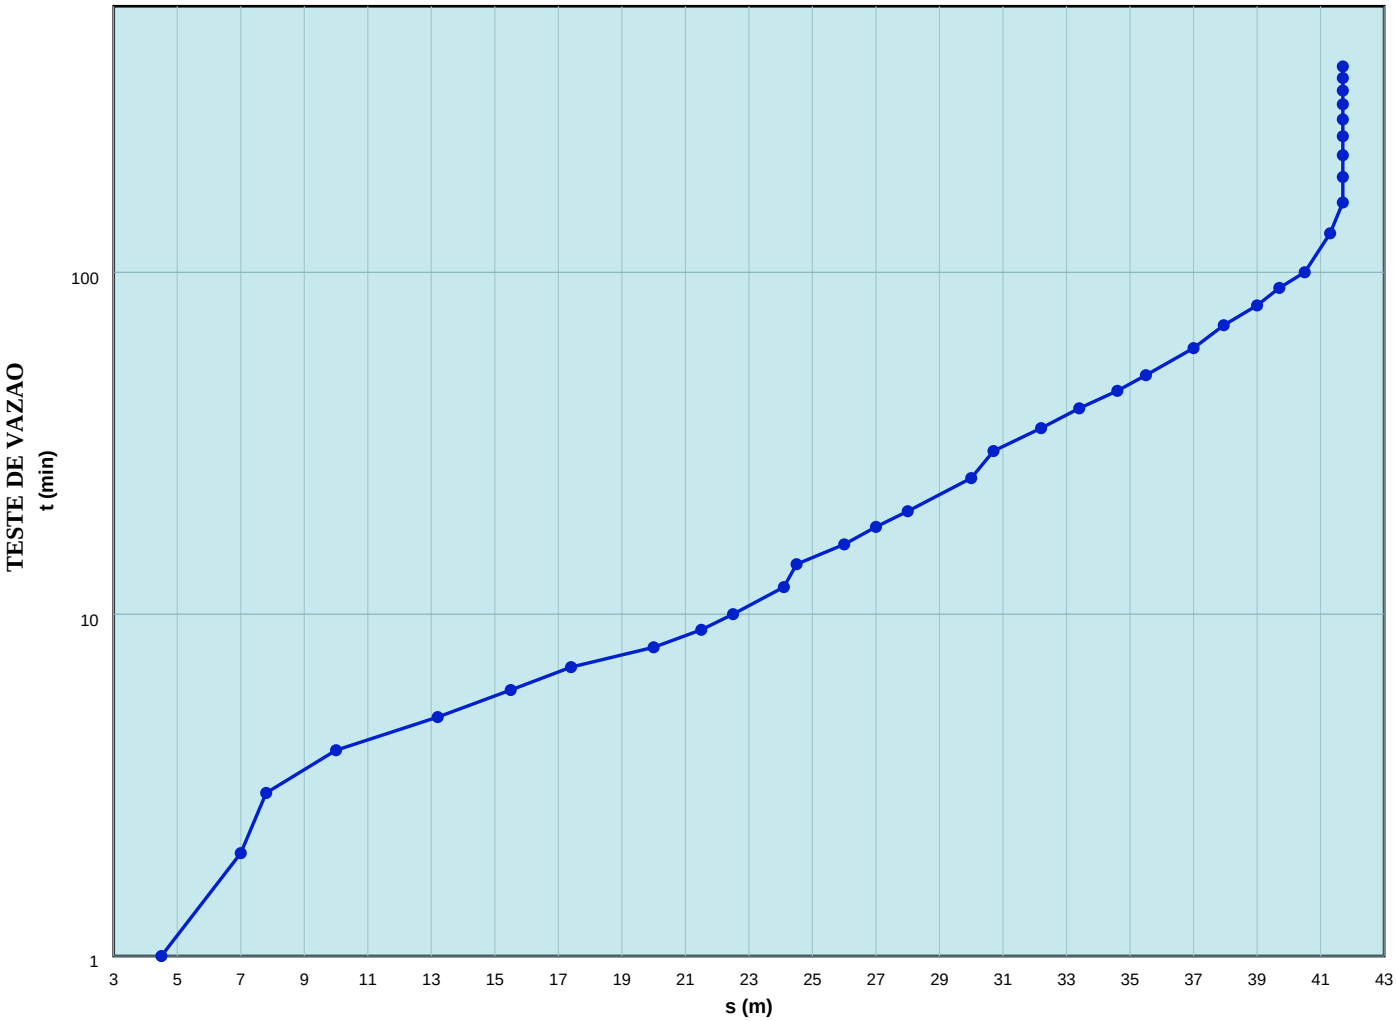


HIDROGEO
ENGENHARIA & POÇOS
SONDAGENS · PERFURAÇÃO · GEOTECNIA

HIDROGEO ENGENHARIA E POÇOS ARTESIANOS LTDA.
CNPJ: 18.492.310/0001-54
End. Av. Los Angeles, 269 – Bairro Jardim Califórnia
Sorriso-MT / CEP 78894-183 / Fone: (65) 3624-1389 Celular: (65) 99972-3112
E-mail: diretoria.geo@geoeste.com.br

ANEXO I.2 — PLANILHA E GRÁFICO SEMI-LOG DE RECUPERAÇÃO RESIDUAL

Poço: PT01 | Crivo: 84,00m | N.E.: 22,40 m | Período Recup.: 13/03/2026 (17:50:00 às 18:25:00) | Recuperação: 96,9%

Hora	t (min)	N.D. (m)	s med (m)	t/t'	s' calc (m)	Observações
17:51:00	0001	62,40	**40,00**	1,00		
17:52:00	0002	60,60	**38,20**	1,00		
17:53:00	0003	58,90	**36,50**	1,00		
17:54:00	0004	57,60	**35,20**	1,00		
17:55:00	0005	56,30	**33,90**	1,00		
17:56:00	0006	55,20	**32,80**	1,00		
17:57:00	0007	54,30	**31,90**	1,00		
17:58:00	0008	53,40	**31,00**	1,00		
17:59:00	0009	53,10	**30,70**	1,00		
18:00:00	0010	52,40	**30,00**	1,00		
18:02:00	0012	50,90	**28,50**	1,00		
18:04:00	0014	49,40	**27,00**	1,00		
18:06:00	0016	47,65	**25,25**	1,00		
18:08:00	0018	46,15	**23,75**	1,00		
18:10:00	0020	44,50	**22,10**	1,00		
18:15:00	0025	39,90	**17,50**	1,00		
18:20:00	0030	36,55	**14,15**	1,00		
18:25:00	0035	33,60	**11,20**	1,00		

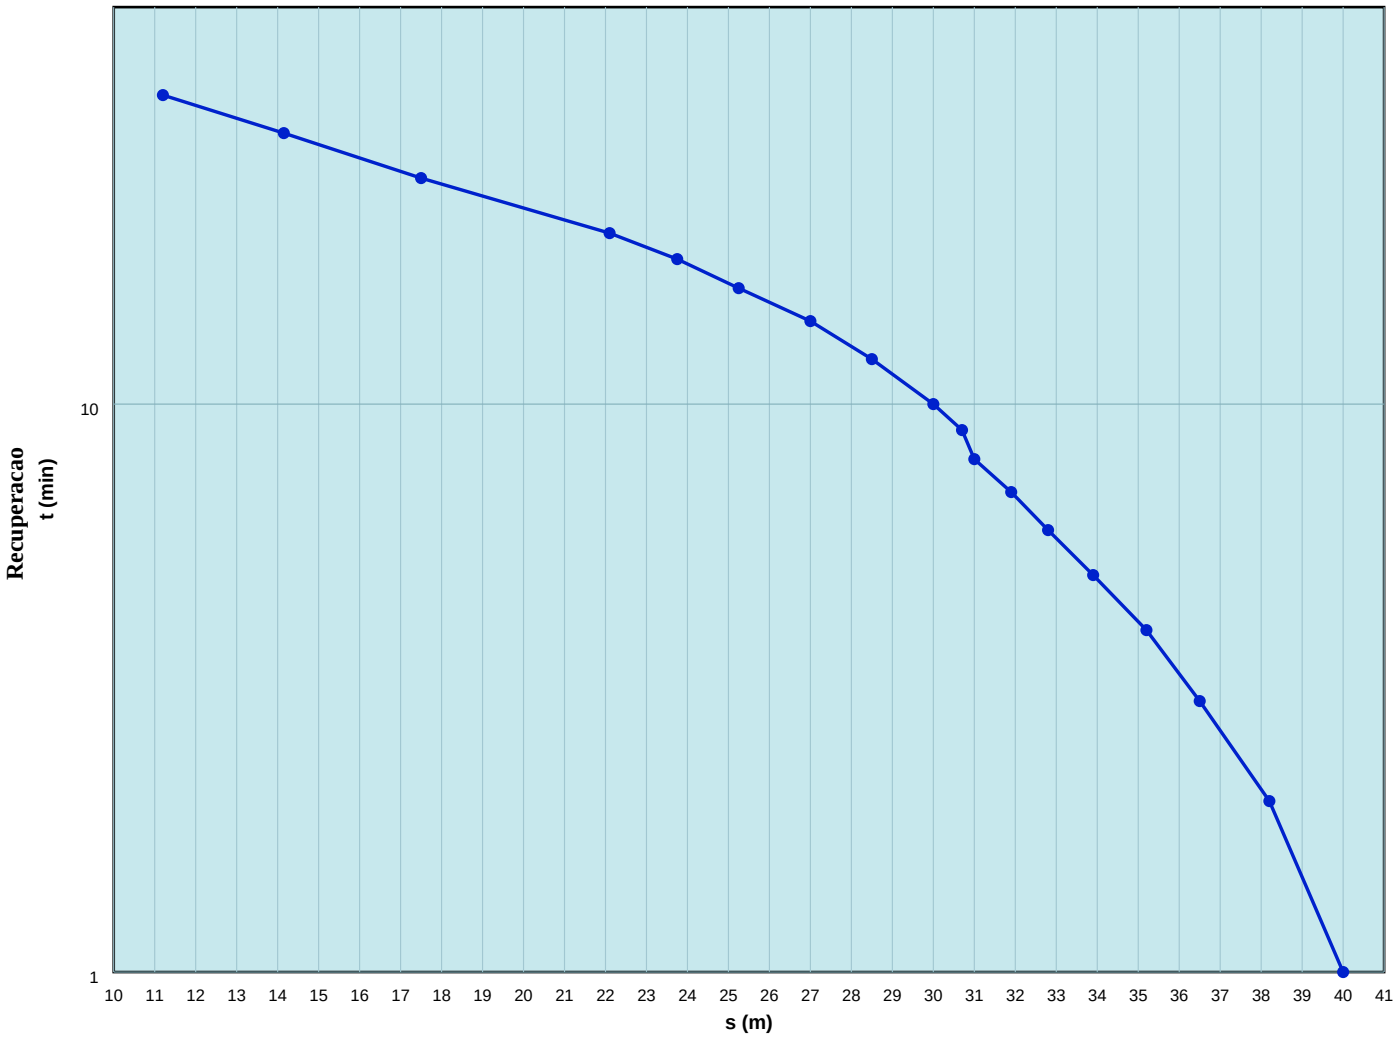



HIDROGEO
ENGENHARIA & POÇOS
SONDAGENS · PERFURAÇÃO · GEOTECNIA

HIDROGEO ENGENHARIA E POÇOS ARTESIANOS LTDA.
CNPJ: 18.492.310/0001-54
End. Av. Los Angeles, 269 – Bairro Jardim Califórnia
Sorriso-MT / CEP 78894-183 / Fone: (65) 3624-1389 Celular: (65) 99972-3112
E-mail: diretoria.geo@geoeste.com.br

ANEXO I.3 — INTERPRETAÇÃO DO TESTE DE BOMBEAMENTO (s = B·Q + C·Q²)

Q (m³/h)	N.D. (m)	s med (m)	s/Q (m/m³/h)	Q/s (m³/h/m)	s calc.	s/Q calc.
10,29	64,10	41,70	4,054	0,247	15,07	1,464

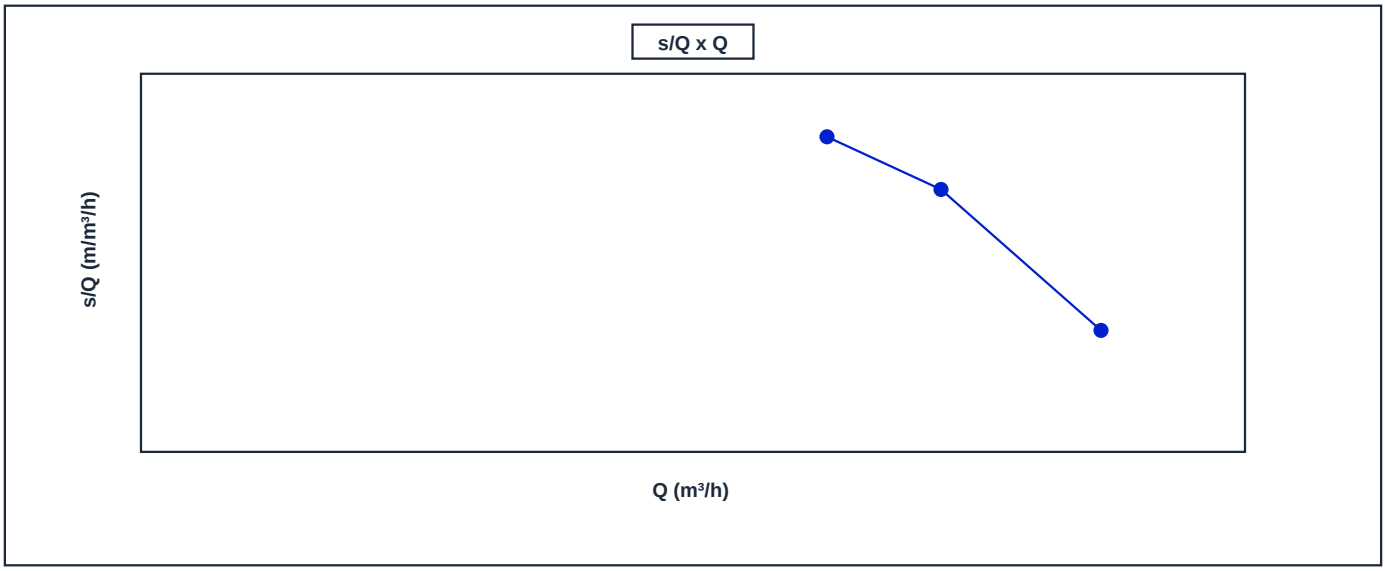

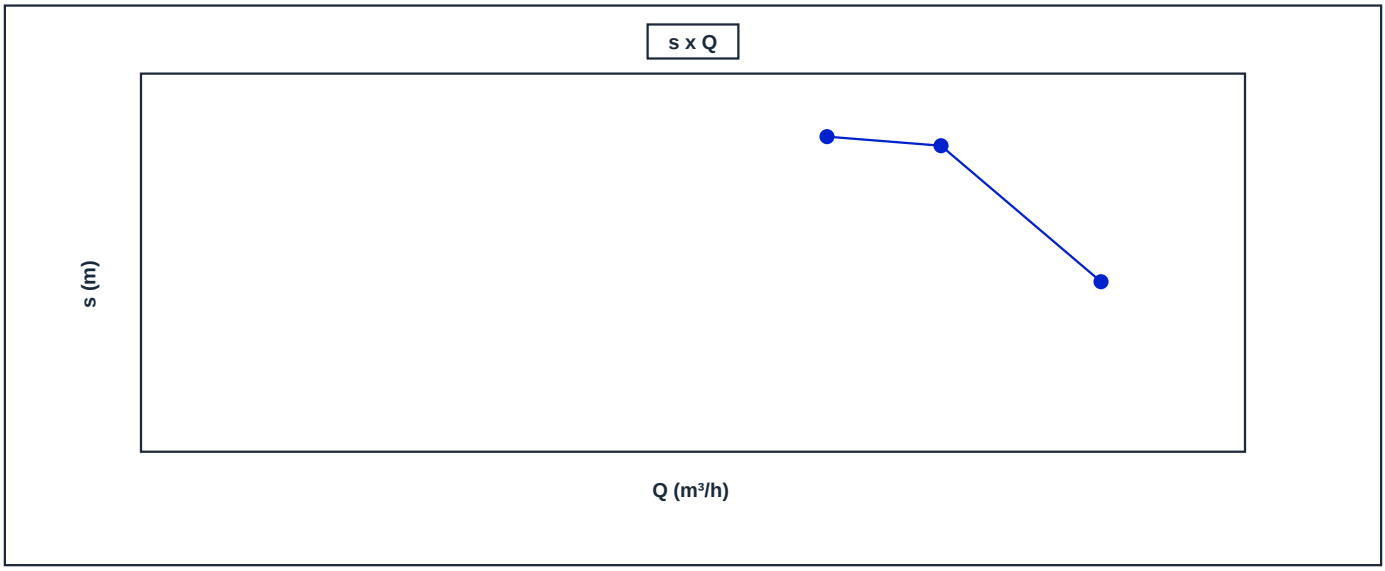

Equação tipo = s = B*Q+CQ²
B = 1,2188
B(24h) = 1,2797
C = 0,02387

Q/s (m³/h/m) = 0,2467
s/Q (m/m³/h) = 4,0541
Eficiência (BQ/(BQ+CQ²)*100) = 83,2%
T (m²/dia) = 2,38

Condições de Operação Prevista

Vazão 1 (m³/h): 10,29 | Nível dinâmico (m): 64,10 | Prof. instalação da bomba (m): 84,00
