


# RELATÓRIOS ESPECIALIZADO DE TESTE DE BOMBEAMENTO

# Ao

FUNDAÇAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO
**Logr.** AV FERNANDO CORREA DA COSTA **Nº** 2367
**Bairro** BOA ESPERANÇA **Cidade** CUIABÁ
**UF** MT **CEP** 78060-900

# Responsavel Pela Execução

GRUPO GEOESTE
**Logr.** Av. Generoso Malheiros **Nº** 748
**Bairro** CIDADE VERDE **Cidade** CUIABÁ
**UF** MT **CEP** 78028-685

# Normas Aplicadas

O teste de bombeamento realizado no poço tubular profundo P01 está em concordância com a norma técnica da ABNT NBR 12244 – Poço Tubular – Construção de Poço Tubular para captação de água subterrânea: 31/03/2006.

# Dados Contratuais

**Ano** 2025 **Nº** 000000837 **Sub-Projeto:** MP00013291 **Cód. Centro Custo:** 10023502
**Descr** MAN PREVENTIVA - BLOCO DIDATICO II UFMT
**ART Nº**

# Endereço da Prestação de Serviço

**Logr.** MAN PREVENTIVA - BLOCO DIDATICO II UFMT **Nº** **Complemento**
**Bairro** MAN PREVENTIVA - BLOCO DIDATICO II UFMT **Cidade**
**UF** **CEP**
**Complementares de Localização**
MAN PREVENTIVA - BLOCO DIDATICO II UFMT

# Responsavel Técnico

**Responsavel Técnico** JOSE ROBERTO RIBEIRO
**Inscrição no Conselho d**

# Equipamento Usado Durante o Teste

**Equipamento de Bombeamento**
ALTRI BOMBA 6AT18-05 7,5CV 220V TRIF | UNID.(UN )

# Dados do Poço

**Prof. N.E. (m) :** 12,500 **Prof. Crivo (m) :** 84,000

17.004.147/0001-52 GRUPO GEOESTE
Fone 65-36241389 Fax E-Mail diretoria.geo@geoeste.com.br
LOGR.: Av. Generoso Malheiros N?.: 748 BAIR.: CIDADE VERDE CID.: CUIABÁ UF.: MT CEP.: 78028-685

# TESTE DE BOMBEAMENTO

**Proprietario** FUNDAÇAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO **C.P.F./C.N.P.J** 33.004.540/0001-00 **Folha** 1 de 1

**Poço** 1 **UF** **Municipio** **Local** MAN PREVENTIVA - BLOCO DIDATICO II UFMT

**Tipo de Teste** TESTE DE VAZAO **Etapa** 48H **Crivo** 84,00 **N.E.** 12,50 **referência de medidas (m)** 0,00

**ART**

**Responsavel**

**Responsavel** JOSE ROBERTO RIBEIRO

**CREA** **C.P.F.** 160.846.674-49

Assinatura

**Coordenada**

| Graus, Min. e Seg. | | Graus Dec. | | UTM | | | Alt.(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Lat.** | **Long.** | **Lat.** | **Long.** | **Lat.** | **Long.** | **MC** | |

**Equipamento de Bombeamento Utilizado**

| Marca | Modelo | Tipo | CV | HP | Nº Estagios | Diam. (mm) | Diam. (Ø) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |


**Periodo**

**Inicial** **Data.** 13/03/2026 **Hora** 11:30:00 **Final** **Data.** 13/03/2026 **Hora** 18:10:00

| Hora | t (min) | N.D. (m) | Q (m³/h) | s med (m) | areia (ppm) | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11:31:00 | 0001 | 17,00 | 14,400 | 4,50 | | |
| 11:32:00 | 0002 | 19,50 | 14,400 | 7,00 | | |
| 11:33:00 | 0003 | 20,30 | 14,400 | 7,80 | | |
| 11:34:00 | 0004 | 22,50 | 14,400 | 10,00 | | |
| 11:35:00 | 0005 | 25,70 | 14,400 | 13,20 | | |
| 11:36:00 | 0006 | 28,00 | 14,400 | 15,50 | | |
| 11:37:00 | 0007 | 29,90 | 14,400 | 17,40 | | |
| 11:38:00 | 0008 | 32,50 | 14,400 | 20,00 | | |
| 11:39:00 | 0009 | 34,00 | 14,400 | 21,50 | | |
| 11:40:00 | 0010 | 35,00 | 14,400 | 22,50 | | |
| 11:42:00 | 0012 | 36,60 | 12,000 | 24,10 | | |
| 11:44:00 | 0014 | 37,00 | 12,000 | 24,50 | | |
| 11:46:00 | 0016 | 38,50 | 12,000 | 26,00 | | |
| 11:48:00 | 0018 | 39,50 | 12,000 | 27,00 | | |
| 11:50:00 | 0020 | 40,50 | 12,000 | 28,00 | | |
| 11:55:00 | 0025 | 42,50 | 12,000 | 30,00 | | |
| 12:00:00 | 0030 | 43,20 | 12,000 | 30,70 | | |
| 12:05:00 | 0035 | 44,70 | 12,000 | 32,20 | | |
| 12:10:00 | 0040 | 45,90 | 12,000 | 33,40 | | |
| 12:15:00 | 0045 | 47,10 | 12,000 | 34,60 | | |
| 12:20:00 | 0050 | 48,00 | 12,000 | 35,50 | | |
| 12:30:00 | 0060 | 49,50 | 12,000 | 37,00 | | |
| 12:40:00 | 0070 | 50,45 | 12,000 | 37,95 | | |
| 12:50:00 | 0080 | 51,50 | 12,000 | 39,00 | | |
| 13:00:00 | 0090 | 52,20 | 12,000 | 39,70 | | |
| 13:10:00 | 0100 | 53,00 | 12,000 | 40,50 | | |
| 13:40:00 | 0130 | 53,80 | 10,286 | 41,30 | | |
| 14:10:00 | 0160 | 54,20 | 10,286 | 41,70 | | |
| 14:40:00 | 0190 | 54,20 | 10,286 | 41,70 | | |
| 15:10:00 | 0220 | 54,20 | 10,286 | 41,70 | | |
| 15:40:00 | 0250 | 54,20 | 10,286 | 41,70 | | |
| 16:10:00 | 0280 | 54,20 | 10,286 | 41,70 | | |
| 16:40:00 | 0310 | 54,20 | 10,286 | 41,70 | | |
| 17:10:00 | 0340 | 54,20 | 10,286 | 41,70 | | |
| 17:40:00 | 0370 | 54,20 | 10,286 | 41,70 | | |
| 18:10:00 | 0400 | 54,20 | 10,286 | 41,70 | | |

17.004.147/0001-52 GRUPO GEOESTE
Fone 65-36241389 Fax E-Mail diretoria.geo@geoeste.com.br
LOGR.: Av. Generoso Malheiros N?.: 748 BAIR.: CIDADE VERDE CID.: CUIABÁ UF.: MT CEP.: 78028-685

# TESTE DE VAZAO

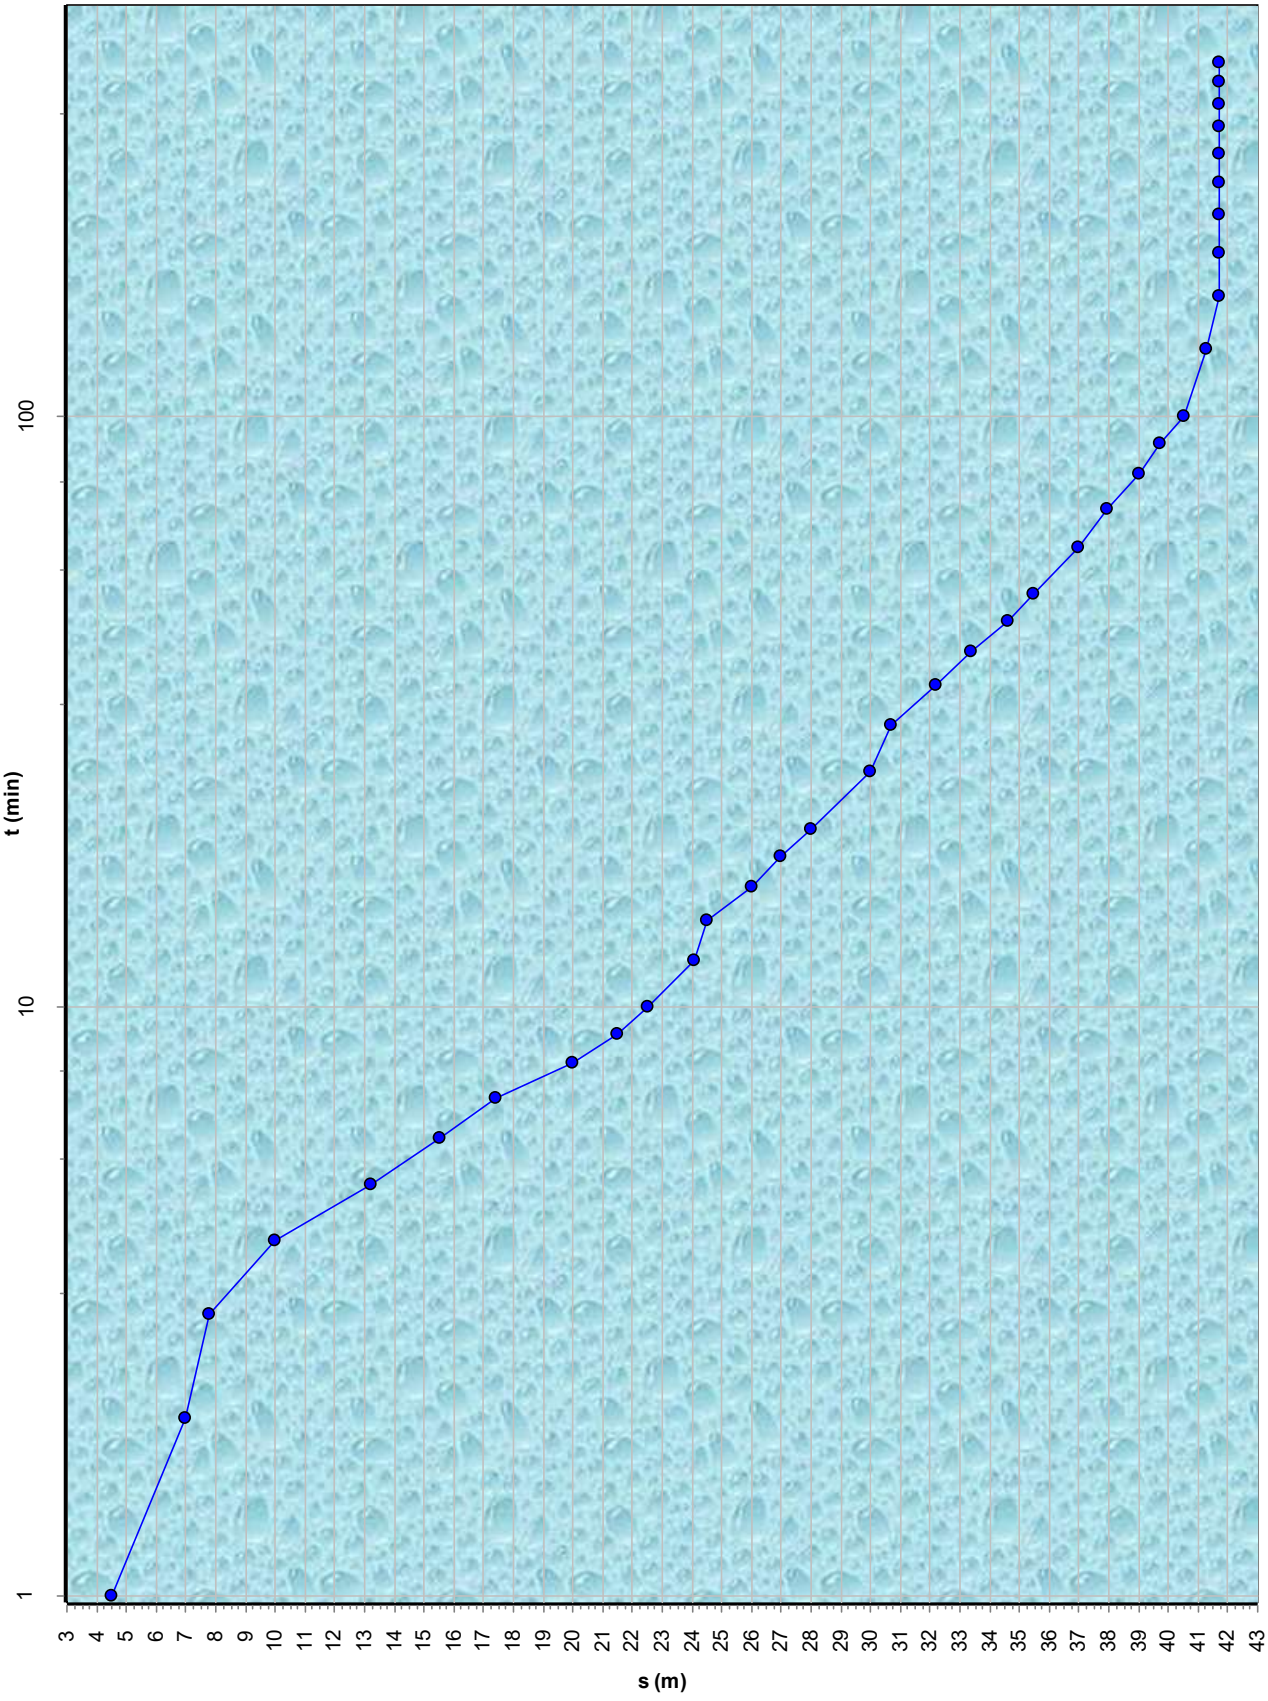

17.004.147/0001-52 GRUPO GEOESTE
Fone 65-36241389 Fax E-Mail diretoria.geo@geoeste.com.br
LOGR.: Av. Generoso Malheiros N?.: 748 BAIR.: CIDADE VERDE CID.: CUIABÁ UF.: MT CEP.: 78028-685

# TESTE DE BOMBEAMENTO

**Proprietario** FUNDAÇAO UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO **C.P.F./C.N.P.J** 33.004.540/0001-00 **Folha** 1 de 1

**Poço** 1 **UF** **Municipio** **Local** MAN PREVENTIVA - BLOCO DIDATICO II UFMT

**Tipo de Teste** Recuperação **Crivo** 84,00 **N.E.** 12,50 **referência de medidas (m)** 0,00

**ART**

**Responsavel**

**Nome** JOSE ROBERTO RIBEIRO

**CREA** **C.P.F.** 160.846.674-49

Assinatura

**Coordenada**

| Graus, Min. e Seg. | | Graus Dec. | | UTM | | | Alt.(m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lat. | Long. | Lat. | Long. | Lat. | Long. | MC | |

**Equipamento de Bombeamento Utilizado**

| Marca | Modelo | Tipo | CV | HP | Nº Estagios | Diam. (mm) | Diam. (Ø) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | OUTROS | 0,00 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 |


**Periodo**

**Inicial** **Data.** 13/03/2026 **Hora** 17:50:00 **Final** **Data.** 13/03/2026 **Hora** 18:25:00

| Hora | t (min) | N.D. (m) | s med (m) | t/t' | s' calc (m) | Observações |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:51:00 | 0001 | 52,50 | 40,00 | 1,00 | | |
| 17:52:00 | 0002 | 50,70 | 38,20 | 1,00 | | |
| 17:53:00 | 0003 | 49,00 | 36,50 | 1,00 | | |
| 17:54:00 | 0004 | 47,70 | 35,20 | 1,00 | | |
| 17:55:00 | 0005 | 46,40 | 33,90 | 1,00 | | |
| 17:56:00 | 0006 | 45,30 | 32,80 | 1,00 | | |
| 17:57:00 | 0007 | 44,40 | 31,90 | 1,00 | | |
| 17:58:00 | 0008 | 43,50 | 31,00 | 1,00 | | |
| 17:59:00 | 0009 | 43,20 | 30,70 | 1,00 | | |
| 18:00:00 | 0010 | 42,50 | 30,00 | 1,00 | | |
| 18:02:00 | 0012 | 41,00 | 28,50 | 1,00 | | |
| 18:04:00 | 0014 | 39,50 | 27,00 | 1,00 | | |
| 18:06:00 | 0016 | 37,75 | 25,25 | 1,00 | | |
| 18:08:00 | 0018 | 36,25 | 23,75 | 1,00 | | |
| 18:10:00 | 0020 | 34,60 | 22,10 | 1,00 | | |
| 18:15:00 | 0025 | 30,00 | 17,50 | 1,00 | | |
| 18:20:00 | 0030 | 26,65 | 14,15 | 1,00 | | |
| 18:25:00 | 0035 | 23,70 | 11,20 | 1,00 | | |

17.004.147/0001-52 GRUPO GEOESTE
Fone 65-36241389 Fax E-Mail diretoria.geo@geoeste.com.br
LOGR.: Av. Generoso Malheiros N?.: 748 BAIR.: CIDADE VERDE CID.: CUIABÁ UF.: MT CEP.: 78028-685


**Recuperação**

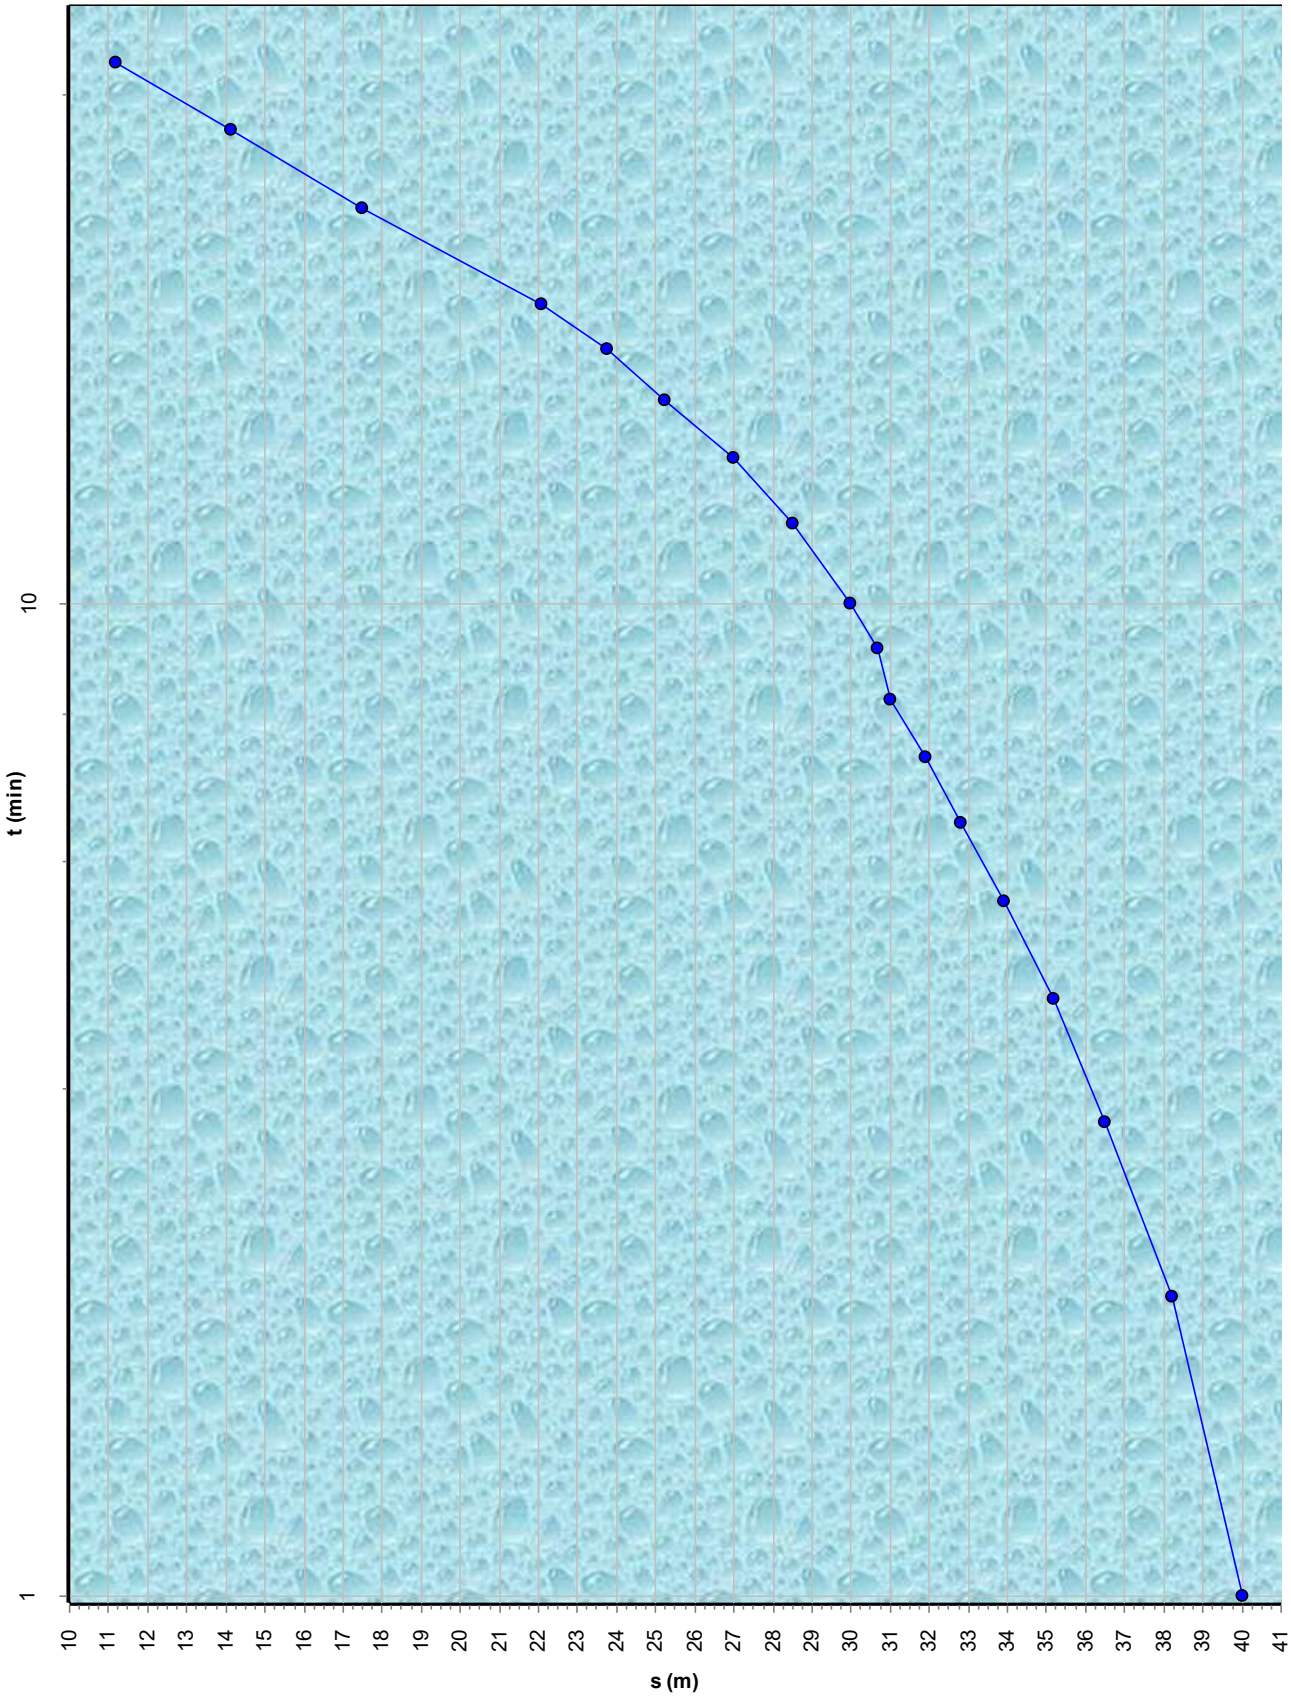


17.004.147/0001-52 GRUPO GEOESTE
Fone 65-36241389 Fax E-Mail diretoria.geo@geoeste.com.br
LOGR.: Av. Generoso Malheiros N?.: 748 BAIR.: CIDADE VERDE CID.: CUIABÁ UF.: MT CEP.: 78028-685

# INTERPRETAÇÃO TESTE DE BOMBEAMENTO

| Q (m³/h) | N.D. (m) | s med (m) | s/Q (m/m³/h) | Q/s (m³/h/m) | s calc. | s/Q calc. (m/m³/h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 10,29 | 54,20 | 41,70 | 4,054 | 0,247 | 0,00 | 0,000 |

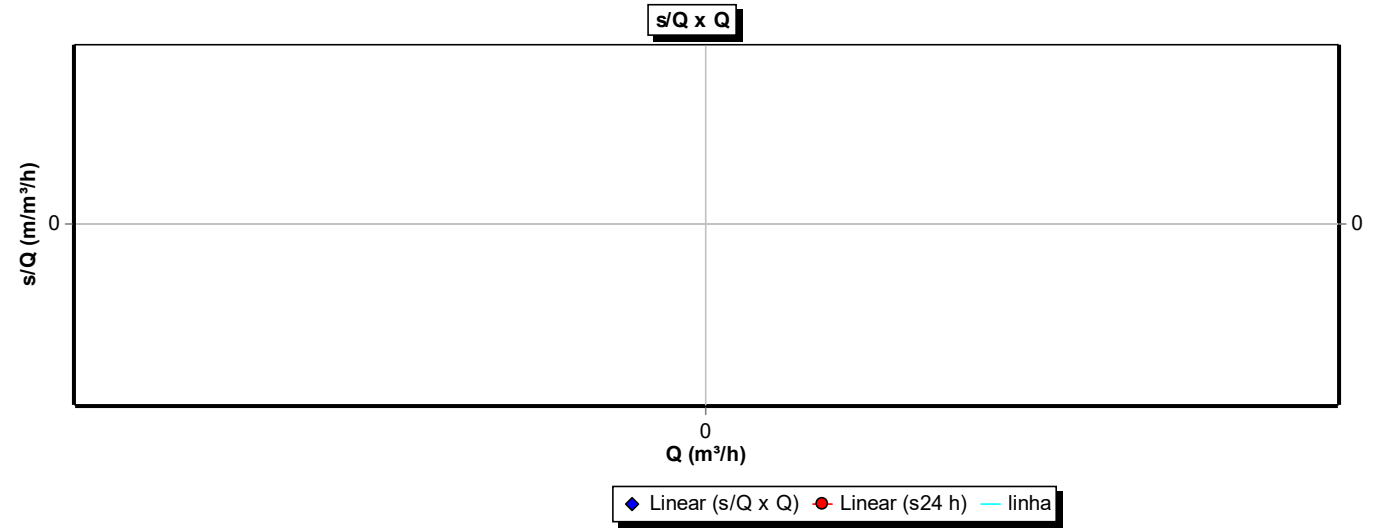

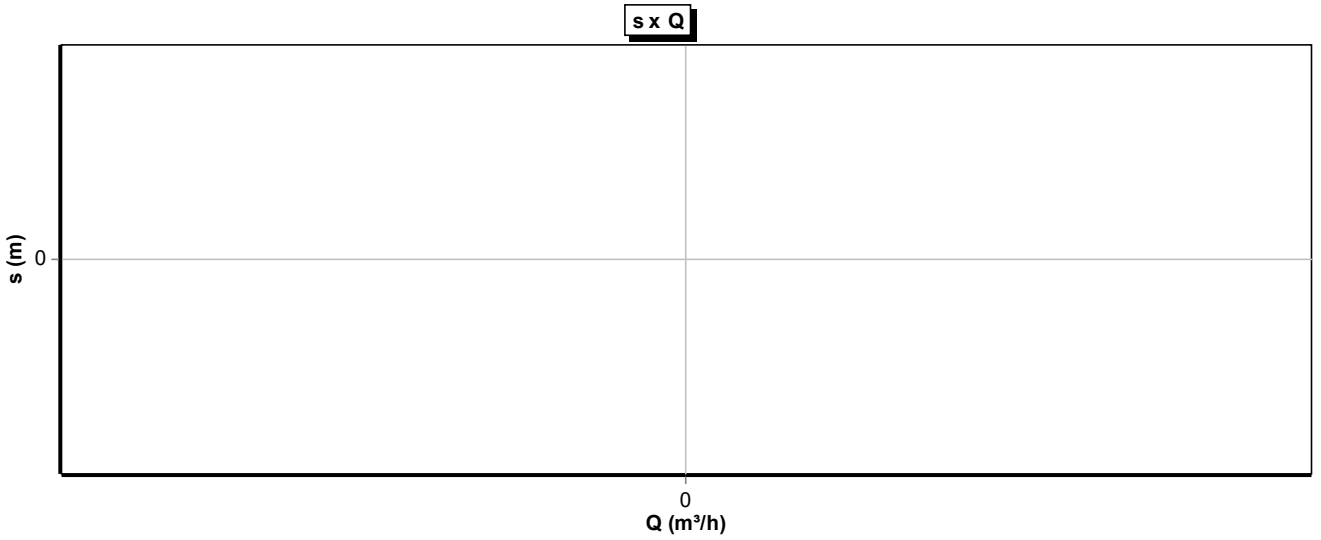
| | | | |
|---|---|---|---|
| Equação tipo = | s= B*Q+CQ² | Q/s (m³/h/m) = | 0,2467 |
| B = | 0 | s/Q (m/m³/h) = | 4,0535 |
| B(24h) = | 0 | Eficiência (BQ/(BQ+CQ²)*100) = | 0 |
| C = | 0 | T (m²/dia) = | 0 |

**Condições de Operação Prevista**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Vazão 1 (m³/h) : | 0,00 | Nivel dinâmico (m) : | 0 | Prof. instalação da bomba (m) : | 84,00 |
| Vazão 2 (m³/h) : | 0,00 | Nivel dinâmico (m) : | 0 | Prof. instalação da bomba (m) : | 84,00 |
